
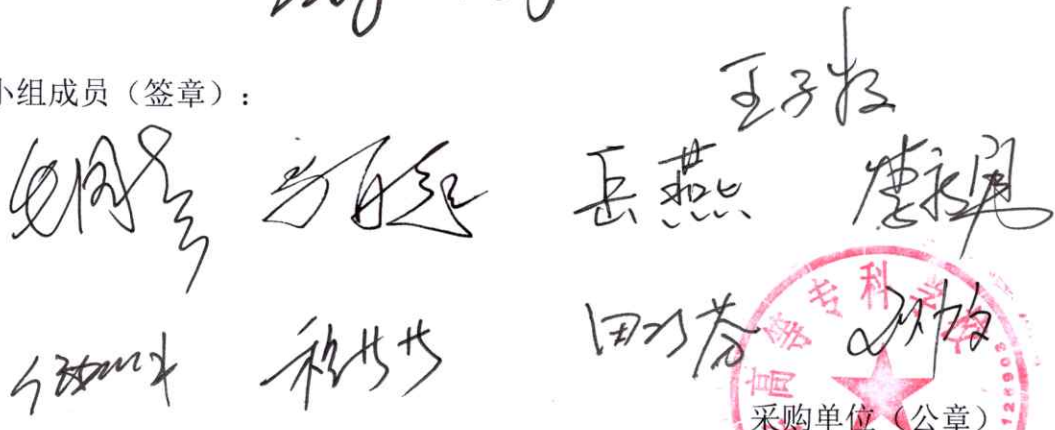


濮阳医学高等专科学校采购项目合同履行验收情况

项目名称	濮阳医学高等专科学校校园基础设施维修-6号宿舍楼装修改造及办公实验用房维修项目		中标单位名称	河南林正建设工程有限公司		
合同金额	3654896.92 元		大写：叁佰陆拾伍万肆仟捌佰玖拾陆元玖角贰分			
政府采购项目编号		濮财市直磋商采购-2024-17				
验收清单	序号	产品名称	规格型号	单价	数量	金额
		后附工程量清单内容				
验收意见	<input type="checkbox"/> 1、供应商提供货物的型号、数量、颜色等是否与中标内容及采购合同内容相符；					
	<input type="checkbox"/> 2、供应商是否按照采购合同和承诺的时间、地点交货；					
	<input type="checkbox"/> 3、货物安装调试是否完成；					
	<input type="checkbox"/> 4、设备是否能够正常运行；					
	<input type="checkbox"/> 5、供应商提供的发票是否真实；					
	最终验收意见和需要说明的事项： 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>					
验收小组负责人（签章）： 						
验收小组成员（签章）： 						
验收日期：2024年9月4日						



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校校园基础设施维修—6号宿舍楼装修改造及办公实验用房维修项目

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质:加气混凝土砌块 2. 楼层运出 3. 运距自定	m3	54.43			
2	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 轻质隔墙拆除 2. 楼层运出 3. 运距自定	m2	374.76			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 地面地砖拆除 2. 楼层运出 3. 运距自定	m2	224.65			
4	011605001002	平面块料拆除	1. 首层地面地砖及垫层附属构件拆除 2. 楼层运出 3. 运距自定	m2	216.81			
5	011608001001	铲除油漆面	1. 墙面墙漆清除 2. 楼层运出 3. 运距自定	m2	18295.68			
6	011610001001	木门窗拆除	1. 原有木门拆除 2. 楼层运出 3. 运距自定	樘	150			
7	011612001001	管道拆除	1. 原有浴室管道拆除 2. 楼层运出 3. 运距自定	m	70.33			
8	011612002004	卫生洁具拆除	1. 淋浴器拆除 2. 楼层运出 3. 运距自定	套	40			
9	011602001001	混凝土构件拆除	1. 混凝土垫层拆除 2. 楼层运出 3. 运距自定	m3	3			
10	011611005001	其他金属构件拆除	1. 换热站钢构件拆除 2. 楼层运出 3. 运距自定	t	0.5			
		分部小计						
		新建工程						
1	010510003001	过梁	1. 过梁 2. 部位: 后加门口 3. 其他满足设计及规范要求	m3	1.11			
2	010802003002	卫生间门	1. 门框、扇材质: 钛镁合金门 2. 其他满足设计及规范要求	m2	257.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校校园基础设施维修—6号宿舍楼装修改造及办公实验用房维修项目

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.首层外窗(原门更换为窗) 2.其他满足设计及规范要求	m ²	26.51			
4	011102001001	石材楼地面	1.一层走廊、换热站、淋浴区地板砖 2.规格800*800 3.其他满足设计及规范要求	m ²	453			
5	011204001001	石材墙面	1.电梯口石材门套 2.其他满足设计及规范要求	m ²	6.48			
6	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷质 3.其他满足设计及规范要求	m ²	53.73			
7	Y010518006001	ALC轻质隔墙条板安装	1.ALC条板隔墙 2.厚度:200 3.其他满足设计及规范要求	m ²	553.01			
8	Y010518006002	ALC轻质隔墙条板安装	1.ALC条板隔墙 2.厚度:100 3.其他满足设计及规范要求	m ²	1725.84			
9	011106001001	地面酸洗	1.酸洗打蜡 3.楼梯 3.其他满足设计及规范要求	m ²	265.8			
10	011106001002	地面酸洗	1.酸洗打蜡 3.地面 3.其他满足设计及规范要求	m ²	3474			
11	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:新建 ALC墙板内粉 2.其他满足设计及规范要求	m ²	2278			
12	011302001002	吊顶天棚	1.6层走廊吊顶 2.铝扣板600*600 3.其他满足设计及规范要求	m ²	140.28			
13	011406001001	抹灰面油漆	1.内墙白色无机涂料 2.其他满足设计及规范要求	m ²	14162.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校校园基础设施维修—6号宿舍楼装修改造及办公实验用房维修项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030411001001	配管	1. 材质:JDG 2. 规格:16 3. 配置形式:暗敷 4. 其他满足设计及规范要求	m	2499.75			
2	030411001002	配管	1. 材质:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他满足设计及规范要求	m	4856.61			
3	030411003001	桥架	1. 规格:100*100 2. 材质:钢制 3. 其他满足设计及规范要求	m	323.96			
4	030411004001	配线	1. 型号:BV2.5 2. 配线部位:管内穿线 3. 其他满足设计及规范要求	m	7499.25			
5	030411004002	配线	1. 型号:BV4 2. 配线部位:管内穿线 3. 其他满足设计及规范要求	m	14569.83			
6	030412001001	普通灯具	1. 类型:圆形LED吸顶灯 2. 其他满足设计及规范要求	套	479			
7	030412001002	普通灯具	1. 类型:方形LED吸顶灯 2. 其他满足设计及规范要求	套	90			
8	040801029001	照明开关	1. 类型:双联开关 2. 其他满足设计及规范要求	个	306			
9	040801030001	插座	1. 类型:五孔插座 10A/220V 2. 其他满足设计及规范要求	个	1222			
10	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:原建筑线管剔槽 2. 填充(恢复)方式:恢复原样 3. 其他满足设计及规范要求	m	703.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校校园基础设施维修—6号宿舍楼装修改造及办公实验用房维修项目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	030504003001	通信接口输入输出设备	1.名称:信息插座底盒 2.规格:塑料	个	153			
12	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料	个	2097			
		分部小计						
		给排水工程						
1	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN15覆塑不锈钢管 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验及冲洗 5.其他:满足设计及规范要求	m	283.34			
2	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN20覆塑不锈钢管 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验及冲洗 5.其他:满足设计及规范要求	m	36.64			
3	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN25不锈钢管 3.连接形式:双卡 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验及冲洗 5.其他:满足设计及规范要求	m	33.8			
4	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN32不锈钢管 3.连接形式:双卡 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验及冲洗 5.其他:满足设计及规范要求	m	57.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校校园基础设施维修—6号宿舍楼装修改造及办公实验用房维修项目

工程名称：安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN40不锈钢管 3. 连接形式:双卡 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验及冲洗 5. 其他:满足设计及规范要求	m	145.68			
6	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN50不锈钢管 3. 连接形式:双卡 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验及冲洗 5. 其他:满足设计及规范要求	m	37.82			
7	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN65不锈钢管 3. 连接形式:双卡 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验及冲洗 5. 其他:满足设计及规范要求	m	48.41			
8	031001003008	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN80不锈钢管 3. 连接形式:双卡 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验及冲洗 5. 其他:满足设计及规范要求	m	31.15			
9	031208002001	管道绝热	1. 热水横管及立管50mm厚橡塑棉保温。 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校校园基础设施维修—6号宿舍楼装修改造及办公实验用房维修项目

工程名称：安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN20 PPR管 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他:满足设计及规范要求	m	204				
11	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN15 PPR管 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他:满足设计及规范要求	m	817.9				
12	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32 PPR管 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他:满足设计及规范要求	m	71.4				
13	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50PSP钢塑复合压力管 3. 连接形式:内涨式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他:满足设计及规范要求	m	138				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校校园基础设施维修—6号宿舍楼装修改造及办公实验用房维修项目

工程名称：安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN65PSP钢塑复合压力管 3. 连接形式:内涨式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他:满足设计及规范要求	m	136.6			
15	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN80PSP钢塑复合压力管 3. 连接形式:内涨式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他:满足设计及规范要求	m	23.8			
16	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100PSP钢塑复合压力管 3. 连接形式:内涨式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他:满足设计及规范要求	m	50.7			
17	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De50 UPVC排水管 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5. 其他:满足设计及规范要求	m	71.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校校园基础设施维修—6号宿舍楼装修改造及办公实验用房维修项目

工程名称：安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De100 UPVC排水管 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5. 其他:满足设计及规范要求	m	414.45			
19	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De75 UPVC排水管 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5. 其他:满足设计及规范要求	m	328.32			
20	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De160 UPVC排水管 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5. 其他:满足设计及规范要求	m	738.47			
21	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:De200 UPVC排水管 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5. 其他:满足设计及规范要求	m	126.8			
22	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其他:满足设计及规范要求	个	153			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校校园基础设施维修—6号宿舍楼装修改造及办公实验用房维修项目

工程名称：安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接 4. 其他:满足设计及规范要求	个	6			
24	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝接 4. 其他:满足设计及规范要求	个	3			
25	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:丝接 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1			
26	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:丝接 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1			
27	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:丝接 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1			
28	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:丝接 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1			
29	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1			
30	011702032001	检查井	1. 新增室外污水检查井 2. 满足设计及规范要求	座	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：濮阳医学高等专科学校校园基础设施维修—6号宿舍楼装修改造及办公实验用房维修项目

工程名称：安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
31	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位: 楼板 2. 洞尺寸: ≤200mm	个	242			
32	011615001002	开孔（打洞）	1. 部位: 墙体 2. 洞尺寸: ≤200mm	个	143			
33	030817008001	套管制作安装	1. 材质: 钢制穿墙套管 2. 规格: ≤200mm 3. 填料材质: 防火砂浆	个	143			
34	030817008002	套管制作安装	1. 材质: 钢制穿楼板套管 2. 规格: ≤200mm 3. 填料材质: 防火砂浆	台	242			
35	031005002001	钢制散热器	1. 暖气片移位	组	12			
36	031005002002	钢制散热器	1. 新装钢制暖气20片 2. 含镀锌供暖管道接至指定主管 3. 满足设计及规范要求	组	8			
37	030701003001	空调器	1. 空调移机	台	138			
38	011602001001	混凝土构件拆除	1. 主管入楼拆除地面混凝土 2. 垃圾出楼 3. 垃圾外运10km 4. 垫层恢复	m ²	55.08			
39	010101003001	挖沟槽土方	1. 首层主管入楼沟槽开挖 2. 含回填 3. 其他满足设计及规范要求	m ³	179.22			
40	080807009001	支架、吊架	1. 管道吊架安装 2. 满足设计及规范要求	t	0.48			
41	011302001001	吊顶天棚	1. 消防控制室及值班室增设铝塑板吊顶	m ²	81.5			
42	011302001002	吊顶天棚	1. 六层走廊吊顶拆除。 2. 六层走廊吊顶铝扣板。 3. 拆除垃圾外运5km。	m ²	127.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

